


1863

145 лет

со времени принятия
в заводские строения
здания, построенного
в Барнауле для Алтайского
горного правления и музея

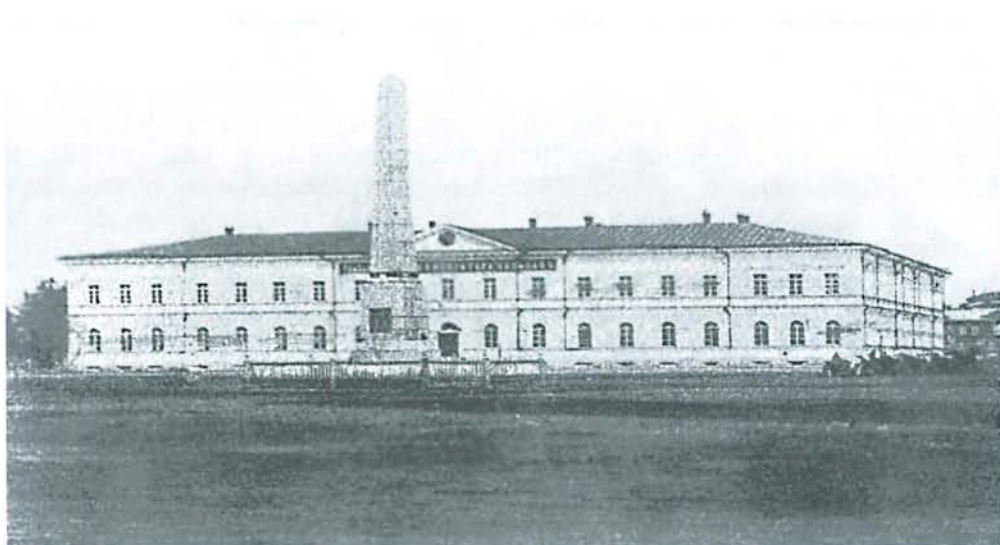

Здание реального училища и обелиск в честь 100-летия горного дела на Алтае. Начало XX в. Здание строилось для Алтайского горного правления, в нем оно размещалось с 1863 по 1872 год. ЦХАФ АК. Фотопозитив № 1710.

«При обозрении моем состоящих в Барнауле заведений я заметил, – писал 12 мая 1843 г. С. П. Татаринов, главный начальник Алтайских горных заводов, горному начальнику Л. А. Соколовскому, – что здание, занимаемое Алтайским горным правлением (ул. Ползунова, 141), совершенно недостаточно для помещения его и нет в нем удобств, которые должны быть при присутственных местах...».

Чрезвычайная теснота помещения Горного правления, особенно во время рекрутского приема или заседания Горного совета, наряду с ветхим состоянием деревянных строений, занятых лабораториями и музеем, побудили С. П. Татаринова предписать горному начальнику «сделать соображение о возведении для всего этого новых приличных каменных зданий».

Помимо этого, надворный советник Гофман, ознакомившись по поручению Штаба Корпуса горных инженеров с состоянием имевшихся в Барнауле ученых и учебных заведений, доложил министру финансов о «несоответственном положении» заводского музея и главной химической лаборатории. 16 июня 1843 г. министр финансов приказал горному начальству Алтайских заводов «приступить к постройке приличного для главной заводской лаборатории здания».

В связи со строительством здания лаборатории к вопросу о строительстве здания для Алтайского горного правления и заводского музея вернулись лишь в 1846 г.

4 апреля 1846 г. Горное правление (вследствие предложения глав-

ного начальника от 12 мая 1843 г.) предписало заводскому архитектору Я. Н. Попову составить проектную документацию на постройку нового каменного здания для помещения Алтайского горного правления и музея. Спустя две недели, 19 апреля, Я. Н. Попов при рапорте о выполнении распоряжения начальства представил планы и смету. Строительство предполагалось вести в течение 5 лет, на месте, где ранее намеревались выстроить здание для горного училища с сиротским отделением, и употребить на это 32814 руб. 98 $\frac{1}{4}$ коп. серебром.

9 сентября 1846 г. главный начальник Алтайских заводов обратился к министру финансов с ходатайством о разрешении строительства нового каменного здания для помещения Горного правления и музея по прилагавшимся к рапорту планам и смете. «...Обязанностью почитаю, – писал С. П. Татаринов, – испрашивать разрешения Вашего высокопревосходительства на возведение помянутого здания с тем, чтобы потребную на эту постройку сумму ассигновать к отпуску по частям в течение пяти лет».

Составленные заводским архитектором Я. Н. Поповым чертежи и смета были отданы для рассмотрения состоявшему при Департаменте горных и соляных дел архитектору Анерту и члену Ученого комитета Корпуса горных инженеров генерал-майору Адаму.

27 октября эксперты доложили Ученному комитету о присланном из Барнаула проекте. По их мнению, проект имел ряд конструктивно-технических издержек, увеличивавших расходы на строительство. Поэтому генерал-майор Адам предлагал убрать назначенные по фасаду здания колонны, «как неподдерживающие ничего», и наружные площадки со ступенями на улицу и во двор, «которые, не будучи защищенными от влияния перемены погоды, могут скоро испортиться и не удобны», а парадную лестницу с колоннами, двойными ступенями сделать проще, чтобы она занимала меньше пространства.

Оба эксперта отметили недостаточность сведений о состоянии грунта на

месте возведения здания для заключения об устройстве его фундамента. «Присутствие воды по углублению в землю до 6 футов есть обстоятельство, весьма благоприятствующее для положения лежней под фундамент, так как в этом случае лежни не подвергнутся гниению, находясь в воде, – писал генерал-майор Адам. – Какого же рода грунт существует ниже воды – об этом ничего не сказано, а без этого нельзя судить, следует ли под лежни употребить сваи, показанные на плане и в смете числом до 2238 штук, или просто возвести фундамент на одних лежнях, без свай...», что привело бы к сокращению расходов на строительство.

8 января 1847 г. Ученый комитет Корпуса горных инженеров, рассмотрев рапорты архитектора Анерта и генерал-майора Адама, решил: чертежи и смету препроводить главному начальнику Алтайских горных заводов для переработки в соответствии с мнением экспертов.

2 апреля Алтайское горное правление постановило: 1) присланные из Петербурга документы передать архитектору Я. Н. Попову для составления нового проекта и сметы с учетом сделанных замечаний и предложений; 2) поручить управляющему Барнаульским заводом майору А. И. Кованько произвести в присутствии заводского архитектора зондирование грунта на месте возведения здания. По окончании работ один ряд профилей отдать Я. Н. Попову для составления сметы.

Исследование почвы показало, что 3-й слой грунта – суглинок – «весьма сильно» пропитан водой, а 4-й – рыхлый белый песок – с большим затруднением поднимается на поверхность из-за сильного притока воды.

16 июня 1847 г. А. И. Кованько, представляя разрез почвы и план зондированного места, доложил Горному правлению, что «более третьей части для фундамента предполагаемого здания имеет забитые сваи, а потому остальные части строения при самом твердом грунте не могут быть возводимы без забивки свай».

16 октября архитектор Я. Н. Попов предложил новый проект здания для Алтайского горного правления и му-

зая, выполненный с учетом замечаний и предложений генерал-майора Адама и архитектора Анерта.

По заключению Ученого комитета, расходы на строительство не должны были превышать 20000 руб. серебром. По новой же смете предполагалось потратить на строительство 29616 руб. 66 коп. По сравнению с 1-м проектом уменьшение было незначительным. Поэтому главный начальник Алтайских заводов П. П. Аносов 2 июля 1848 г. предложил Горному правлению пересмотреть цены на некоторые материалы по новой смете.

Исполняя распоряжение Горного правления по предписанию главного начальника, управляющий Барнаульским заводом подполковник А. И. Кованько 6 августа аргументированно доложил, почему «нет никакой возможности удешевить цену извести и бутового камня». А архитектор Я. Н. Попов в рапорте от 9 августа заявил, что по сырости предназначенного для строительства места употребление на устройство фундамента кирпича вместо камня может повредить прочности здания.

Горное правление согласилось с мнением местных специалистов. 22 ноября горный начальник Л. А. Соколовский представил П. П. Аносову постановление Алтайского горного правления о невозможности удешевления сметы и о необходимости ходатайствовать перед высшим начальством об ее утверждении. По неизвестным причинам министру финансов новые проектные документы были представлены лишь в 1850 г., при рапорте главного начальника от 8 мая.

Для предварительного заключения проект и смету поручили рассмотреть генерал-майору Адаму и архитектору Департамента горных и соляных дел Шрейберу.

Архитектор Шрейбер, стараясь уменьшить сумму расходов на строительство, внес ряд поправок в проект Я. Н. Попова. Вследствие этого генерал-майор Адам в рапорте Ученому комитету от 28 декабря 1851 г. писал: «...Чтобы при построении здания не могло встретиться какого-либо недоразумения по сделанным господином Шрейбером замечаниям,

полезно сделать новые подробные планы, фасад и разрез...».

23 января 1852 г. Ученый комитет, рассмотрев предложение генерал-майора Адама, поручил архитектору Шрейберу выполнить проектные чертежи в соответствии с собственными поправками. Судя по документам, исполнение поручения Ученого комитета затянулось на целый год. 7 марта 1853 г. Департамент горных и соляных дел препроводил в Ученый комитет Корпуса горных инженеров составленные архитектором Шрейбером «новые планы, фасады и разрез о постройке в Барнауле здания для помещения Алтайского горного правления и музеума».

8 июля того же года Ученый комитет, заслушав рапорт генерал-майора Адама о проекте Шрейбера как составленном правильно и соответствующем своему назначению, принимает решение об его утверждении и препровожении «вместе с исправленной сметой и замечаниями Шрейбера к главному начальнику Алтайских заводов к надлежащему исполнению и руководству при сооружении упомянутого здания». Спустя шесть с половиной лет (!) Ученый комитет признал проект здания для Алтайского горного правления с музеем, «исправленным согласно положению Комитета от 8 января 1847 г.».

8 августа 1853 г. министр финансов П. Брок, сообщая главному начальнику Алтайских заводов В. А. Бекману о своей согласии на постройку в Барнауле нового каменного здания для помещения Горного правления и музея, предписал: «...исчисленную на оную по сметам сумму – 21469 руб. 30¹/₂ коп. – внести в смету расходов по Алтайским заводам, разложив оную к ассигнованию на 2 года, а к производству самой постройки приступить не прежде, как по воспоследовании на означенную смету высочайшего соизволения».

Строительство здания началось в 1854 г. 29 марта управляющий Барнаульским заводом подполковник А. И. Кованько получил чертежи и предписание Горного правления о начале строительных работ. В течение строительного сезона 1854 г. были забиты сваи (2100) и

выложен фундамент из бутового камня до горизонта земли. Весной 1855 г. продолжались работы по выводу фундамента на поверхность земли и образованию цоколя. К 20 сентября планировали закончить кладку 1-го этажа. На ведение кирпичной кладки профессиональными каменщиками заключили подряд с крестьянами: Нижегородской губернии – Дмитрием Кругловым и Владимирской – Григорием Бодуновым.

В ходе строительства выявилось несоответствие проектного плана и сметы. 28 апреля 1855 г. управляющий Барнаульским заводом докладывал Алтайскому горному правлению, что «при рассмотрении планов нижнего этажа оказывается, что начерчены линии, означающие коробчатые своды. Но как в утвержденной смете сводов не положено и материалов на это не исчислено, а назначены арки», то просил разрешить следовать указаниям сметы и не строить по плану.

Несмотря на то, что отступление от сметы должно было привести к значительным и невозполнимым расходам, главный начальник Алтайских заводов В. А. Бекман вынес решение: «Так как такие здания возводить без сводов запрещено, своды делать согласно плану, без изменения».

23 мая 1858 г. главный начальник Алтайских горных заводов А. Д. Озерский писал в Кабинет: «...по осмотре вчерне совершенно готового нового здания Горного правления нашел постройку его весьма прочной. По внешнему виду оно удовлетворяет требованиям изящества, помещительностью же вполне соответствует своему назначению».

В 1858 г. главный начальник Алтайских заводов был вынужден ходатайствовать перед Кабинетом е. и. в. об утверждении дополнительной сметы на окончательную достройку здания Горного правления. Средства требовались на устройство из кирпича фонаря по заднему фасаду здания, на оштукатуривание внутренних и внешних стен, на установку во фронте лицевого фасада чугунного герба Российского государства и на другие работы.

21 декабря 1858 г. председатель Кабинета барон П. К. Мейендорф

сообщил главному начальнику А. Д. Озерскому об утверждении дополнительного проекта и сметы на достройку здания. По исчислению архитектора Кабинета Бейне ассигновывалось 3748 руб. 19½ коп.

31 октября 1861 г. Барнаульская горная контора рапортовала в Алтайское горное правление об окончании строительства здания и просила сделать распоряжение об освидетельствовании строения и записи его на приход по капиталу оконченных строений.


Освидетельствование поручили помощнику горного начальника полковнику Богданову, подполковнику Прангу 2-му и архитекторскому помощнику Серебренникову. Последний находился в Гурьевском заводе и по состоянию здоровья не мог выехать в Барнаул. Подполковник Пранг 2-й, согласно поданному прошению, был уволен «по болезненному состоянию» в Петербург, на 2 месяца. В связи с этим Горное правление 4 января 1862 г. постановило: поручить освидетельствование архитекторскому помощнику Руммелю, а вместо Пранга 2-го назначить подполковника Васильева.

18 декабря 1862 г. каменное двухэтажное здание для помещения Алтайского горного правления и музея освидетельствовали и пришли к выводу, что оно выстроено прочно и во всем согласно с утвержденными проектами и сметами, за исключением навеса у «наружного парадного крыльца».

24 декабря Горное правление предписывает Барнаульской горной конторе записать «ныне же упомянутое здание на приход по капиталу заводских строений». Но из-за рождественских праздников Барнаульская контора получила предписание только 7 января 1863 г. Когда оно было исполнено? Об этом документы пока молчат.

В 1872 г., по распоряжению начальника Алтайских заводов Ю. И. Эйхвальда, здание Горного правления отдали Барнаульскому окружному училищу. Главное же управление Алтайского горного округа разместилось в бывшем до этого здании училища.

Л. И. Ермакова

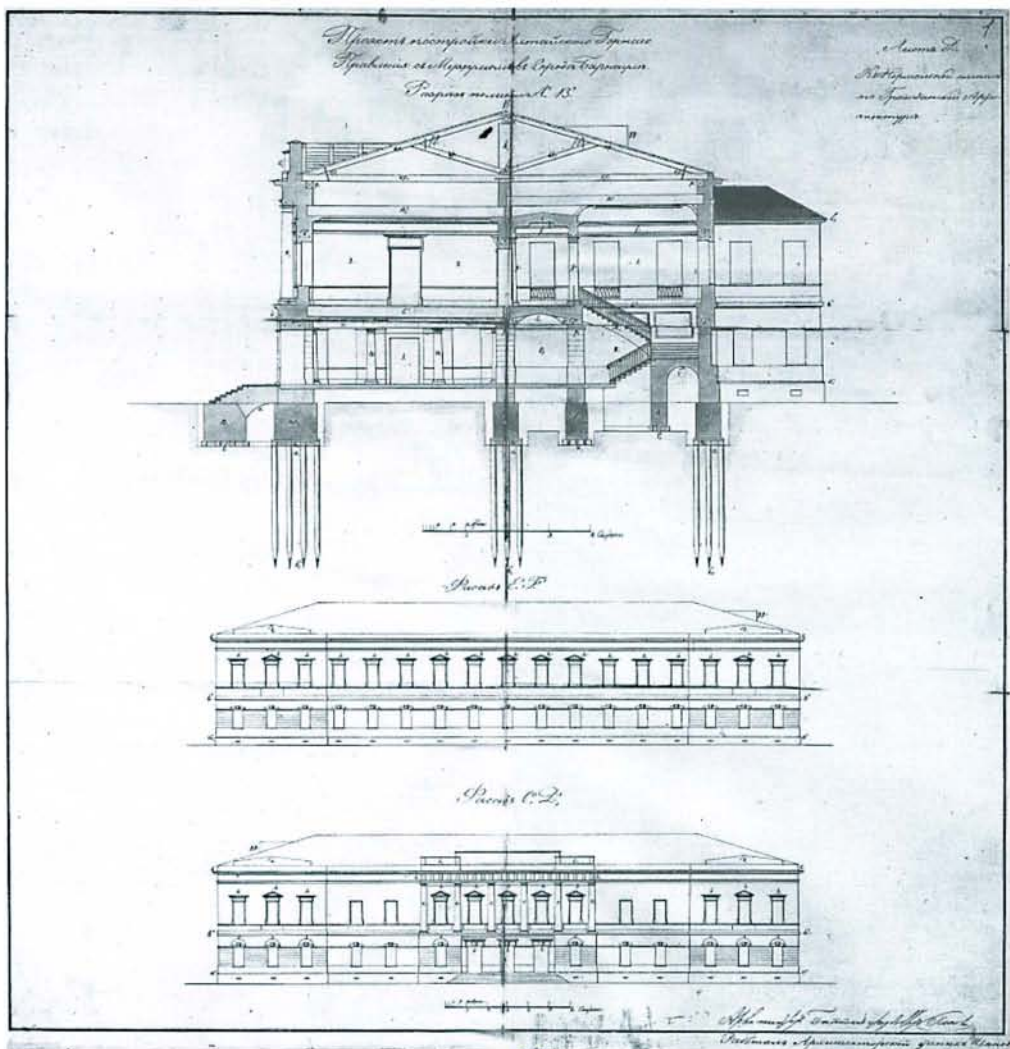

Первый проект постройки здания для помещения Алтайского горного правления с музеем, составленный архитектором Я.Н. Поповым в 1846 г. ЦХАФ АК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2468. Приложение, л. 1.

ЛИТЕРАТУРА

Баландин, С. Н. Архитектура Барнаула. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. 112 с.: ил. Библиогр. в подстроч. примеч. – Из содерж.: [здание Горного правления]. С. 37–38, 40–42.

Памятники архитектуры Барнаула / А. П. Долнаков, Е. А. Долнакова, Л. А. Зотеева, Т. М. Степанская. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. 160 с.: ил. Библиогр.: с. 159. – Из содерж.: [здание Горного правления и музея]. С. 54–60.

Целищева, М. Горное училище // Алтайский благодатный край. М., 2007. С. 154–155: фото. цв. (Наследие народов Российской Федерации; вып. 8).

О строительстве здания Горного правления.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Центр хранения Архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК). Ф. 2. Оп. 1. Д. 2402, 2468, 2859, 3183.
